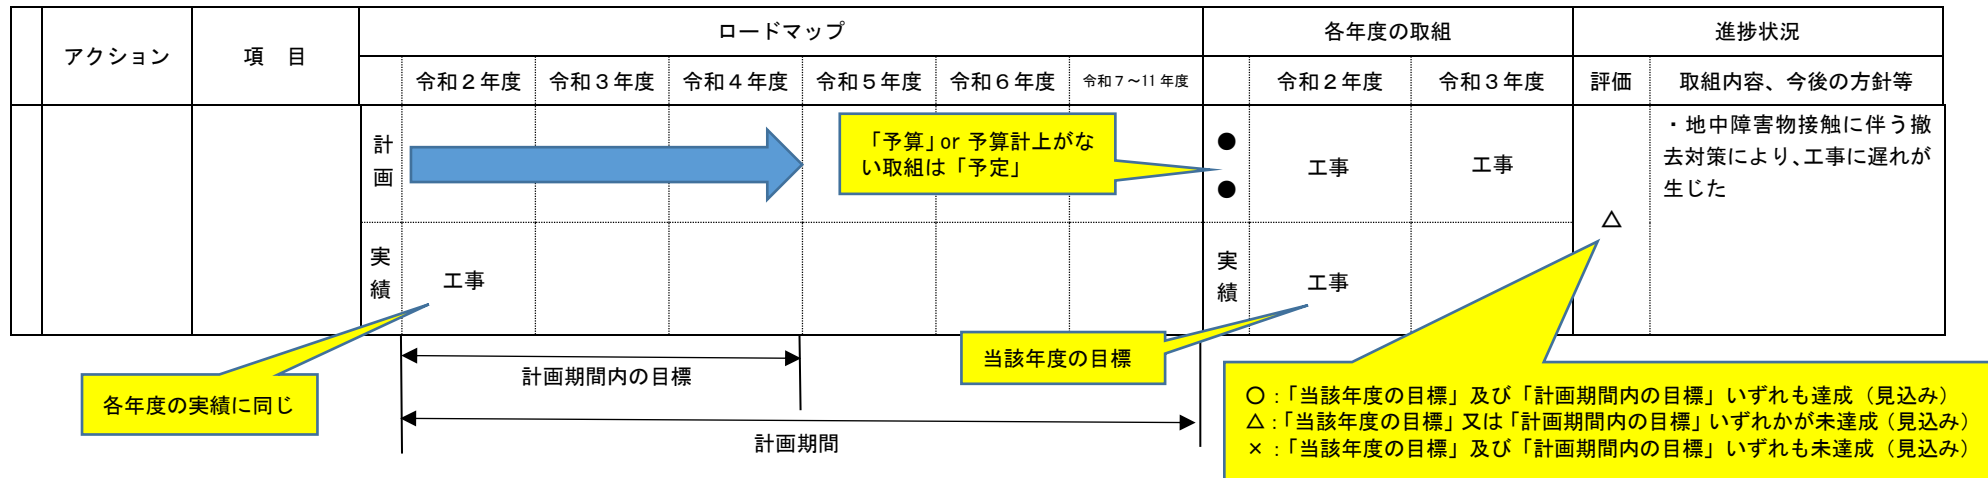


経営戦略 2020-2029 の進捗状況について

◆凡例









◆進捗状況

施策の方向性	アクション数 (項目数※)	目標の進捗状況（構成比）						備考
		○	△	×	○	△	×	
1 災害に強く、安全で良質な水を持続して供給できる施設を整備する	11(35)	24	68.6%	9	25.7%	2	5.7%	
2 構成団体と相互に連携しながら、災害などに迅速に対応する	1(3)	3	100%					
3 安全で良質な水をお届けする	1(2)	2	100%					
4 さらなる経営改革に取り組み、持続可能な経営基盤を構築する	6(14)	11	78.6%	3	21.4%			
5 水道事業の全体最適化に向け、府域一水道をめざす	1(3)	3	100%					
6 エンドユーザーの立場に立ち、お客さまサービスの向上に努める	3(9)	7	77.8%	2	22.2%			
7 社会的責務を果たし、信頼される企業団をめざす	5(15)	11	73.3%	4	26.7%			
合計	28(81)	61	75.3%	18	22.2%	2	2.5%	

※令和2年度の評価がないものを除く。

# 抜 粋

大阪広域水道企業団経営戦略2020-2029 令和2年度の進捗状況(令和2年度の評価が△又は×のもの) ※(用供)は水道用水供給事業、(水道)は水道事業、(工水)は工業用水道事業に係る取組

アクション	項目	ロードマップ						各年度の取組			進捗状況			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7～11年度	令和2年度	令和3年度	評価	取組内容、今後の方針等			
施策の方向性 1	①取水施設 磯島取水場の更新・耐震化	計画	 R10						予算	基本設計	基本設計	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本設計委託を2度発注したが、入札者がなかったため、令和3年度に改めて発注予定。</li> <li>施工手順等の見直しにより、工期短縮に努める。</li> </ul>	
		実績	— (基本設計入札不調)						実績	— (基本設計入札不調)				
	②浄水施設 (7)村野浄水場西系浄水施設の更新	計画	 R10						予算	基本設計	基本設計 実施設計	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る対応により、業務に遅れが生じた(令和3年度に基本設計委託完了予定)。</li> <li>施工手順等の見直しにより、工期短縮に努める。</li> </ul>	
		実績	基本設計						実績	基本設計				
	①連絡管・ループ管の整備	(7)河南連絡管	計画	 R10						予算	工事 (河南6工区) 実施設計 (河南7工区) 基本設計 (管路DB工区) 管路DB発注	実施設計 (河南7工区) 管路DB発注	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係者との協議に日数を要したため、管路DBの発注に遅れが生じた(令和3年度発注)。</li> <li>工事受注者と協議し、工期短縮に努める。</li> </ul> <p style="text-align: right;">※DB(デザイン・ビルド)：設計、施工を一括で発注する方式</p>
			実績	工事完了 (河南6工区) 実施設計 (河南7工区) 基本設計 (管路DB工区)						実績	工事完了 (河南6工区) 実施設計 (河南7工区) 基本設計 (管路DB工区)			
①(ウ)系統連絡管 ※庭窪～万博(樫切山)		計画	 R10						予算	工事 (シールド工)	工事 (シールド工) (二次覆工)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>地中障害物接触に伴う撤去対策により、シールド工に遅れが生じた(令和3年度にシールド工完了予定)。</li> <li>今後の工事において工期短縮に努める。</li> </ul>	
		実績	工事 (シールド工)						実績	工事 (シールド工)				
①(イ)千里幹線バイパス管	計画	 R10						予算	工事 (2工区) (3工区)	工事 (3工区)	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>3工区：地元調整の結果、施工時間に関する条件に変更が生じたため、工事に遅れが生じた(令和3年度に工事完了予定)。</li> </ul>		
	実績	工事完了 (2工区) 工事 (3工区)						実績	工事完了 (2工区) 工事 (3工区)					
③自動検針システムの更新	②自動検針システムの更新	計画	 R10						予算	基本設計	基本設計	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>発注内容の精査により、発注を後送り(令和3年度に基本設計委託発注予定)。</li> <li>今後の工期短縮に努める。</li> </ul>	
		実績	—						実績	—				

アクション	項目	ロードマップ						各年度の取組			進捗状況				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7～11年度	令和2年度	令和3年度	評価	取組内容、今後の方針等				
施策の方向性 1	<<アクション1-5>> (水道) ◆設備の更新  ※計画は完成年次を記載	電気計装設備、ポンプ設備等の更新	計画							予算	11箇所	15箇所	△	・3箇所は、工事の入札不調等により工事に遅れが生じた(令和3年度完了予定)。	
			実績	8箇所						実績	8箇所				
	<<アクション1-9>> (工水) ◆取水・浄水施設の更新・耐震化(大庭浄水場)	①調整池及び配水ポンプ棟の整備	計画							予算	工事(基礎工)	工事(躯体工)	△	・関係者との協議に日数を要し、工事の進捗に遅れが生じた(令和4年度完了予定)。	
			実績	工事(基礎工)						実績	工事(基礎工)				
	<<アクション1-10>> (工水) ◆配水管路の更新・耐震化	①連絡管・ループ管の整備 大庭～三島連絡管	計画							予算	工事(シールド工)	工事(シールド工)(二次覆工)	×	・地中障害物接触に伴う撤去対策により、シールド工に遅れが生じた(令和4年度完了予定)。	
			実績	工事(シールド工)						実績	工事(シールド工)				
	<<アクション1-11>> (工水) ◆設備の更新	②自動検針システムの更新	計画							予算	基本設計	基本設計	△	・発注内容の精査により、発注を後送り(令和3年度に基本設計委託発注予定)。 ・今後の工期短縮に努める。	
			実績	—						実績	—				
		③ポンプ設備の更新 大庭配水ポンプ	計画							予算	工事	工事	△	・関連工事の遅れに伴い、令和4年度完成予定。	
			実績	工事						実績	工事				
	施策の方向性 4	<<アクション4-2>> ◆支出の縮減	①会議等開催場所の変更(6～10百万円)	計画							予定	実施	継続実施	△	・企業団施設での開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部会場使用料が発生。 ・令和3年度以降も新型コロナウイルス感染症の状況等を勘案しながら、会議等の開催手法を検討していく。
				実績	実施						実績	実施			
③設計施工一括発注方式による建設コストの縮減(173百万円)		計画							予定	DB発注	DB発注	△	・関係者との協議に日数を要したため、管路DBの発注に遅れが生じた(令和3年度発注)。		
		実績	—						実績	—					

※DB(デザイン・ビルド)：設計、施工を一括で発注する方式

アクション	項目	ロードマップ						各年度の取組			進捗状況	
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7～11年度	令和2年度	令和3年度	評価	取組内容、今後の方針等	
施策の方向性 4	<<アクション4-5>> ◆民間活力の活用 ①管路整備事業におけるDB方式の導入	計画	DB方式での発注				DB方式の検証 対象事業の拡大に向けた検討	予定	DB発注	DB発注	△	・関係者との協議に日数を要したため、管路DBの発注に遅れが生じた(令和3年度発注)。  ※DB(デザイン・ビルド)：設計、施工を一括で発注する方式
		実績	—						実績	—		
施策の方向性 6	①水道水のPRイベント 利き水会の実施  各種イベントの実施	計画	継続実施					予定	実施	継続実施	△	・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、実施を見送り。 ・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、関係団体と調整。
		実績	—						実績	—		
		計画	随時実施					予定	実施	継続実施	△	・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、全てのイベント実施を見送り。 ・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、イベント関係者と調整。
		実績	—						実績	—		
施策の方向性 7	<<アクション7-1>> ◆温室効果ガス総排出量の削減 ②商用電力使用量 (427百万kWh)	計画	前年度比1%ずつ削減					予定	実施	継続実施	△	・商用電力使用量：444百万kWh(前年度比101%) ・給水量の増加に伴う電力使用量の増加。  ※給水量：水道用水供給事業及び水道事業の有収水量と工業用水道事業の実使用水量の合計量
		実績	実施						実績	実施		
	③単位給水量当たりの電力使用量 (707kWh)  ※用供・工水	計画	低減					予定	実施	継続実施	△	・電力使用量：727kWh(前年度比100%) ・浄水池清掃等に伴う電力使用量の増加。
		実績	実施						実績	実施		
	<<アクション7-2>> ◆省エネルギー機器の導入 ペーパーレス化の推進	計画	維持向上					予定	実施	継続実施	△	・コピー用紙購入枚数：前年度比106% ・令和3年度中に、会議のペーパーレス化等に向けた検討を行う。
		実績	実施						実績	実施		
<<アクション7-5>> ◆国際貢献 ①海外研修生の受入れ等	計画	ニーズに基づき実施					予定	実施	継続実施	△	・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、技術交流の覚書を締結しているタイ王国首都圏水道公社(MWA)との研修に伴う受入れは未実施。 ・令和3年度以降、リモートによる研修の実施や技術支援について検討していく。	
	実績	—						実績	—			—
